




Опыт цифровизации проектного управления капитальным строительством

для реализации национальных проектов





Предпосылки для перехода в цифру



Большое число одновременно возводимых объектов (150-200)



Многоуровневая структура ответственности и полномочий



Бюджет, исчисляемый миллиардами рублей



Уникальность и нетипизированность



Высокая ответственность за успешную реализацию каждого объекта



Сложность объективного контроля и оценки рисков

Данные и информационное взаимодействие

Электронный бюджет Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)

ГИС ОГД Региона

Региональные ГИС в сфере строительства

Госэкспертиза



Касса(РГИСы финансового блока)

ВІМ (опционально)

Возможно сохранять баланс детализации в пределах здравого смысла



60 показателей на этапе ПИР



400-450 показателей расходования средств



80 показателей на этапе землеотвода



80 показателей на этапе СМР




40 типовых **отчетных форм**



500 сущностей, атрибутов, зависимостей и расчетных формул

Эфекты




- Достоверный отчет любого уровня детализации онлайн
- Нагрузка на проектного менеджера– 50%
- Сокращение сроков до -10%
- Фото- и видеофиксация
- Моделирование рисков
- Мобильность рабочего места

Пользовательский интерфейс


Работа с проектами на карте



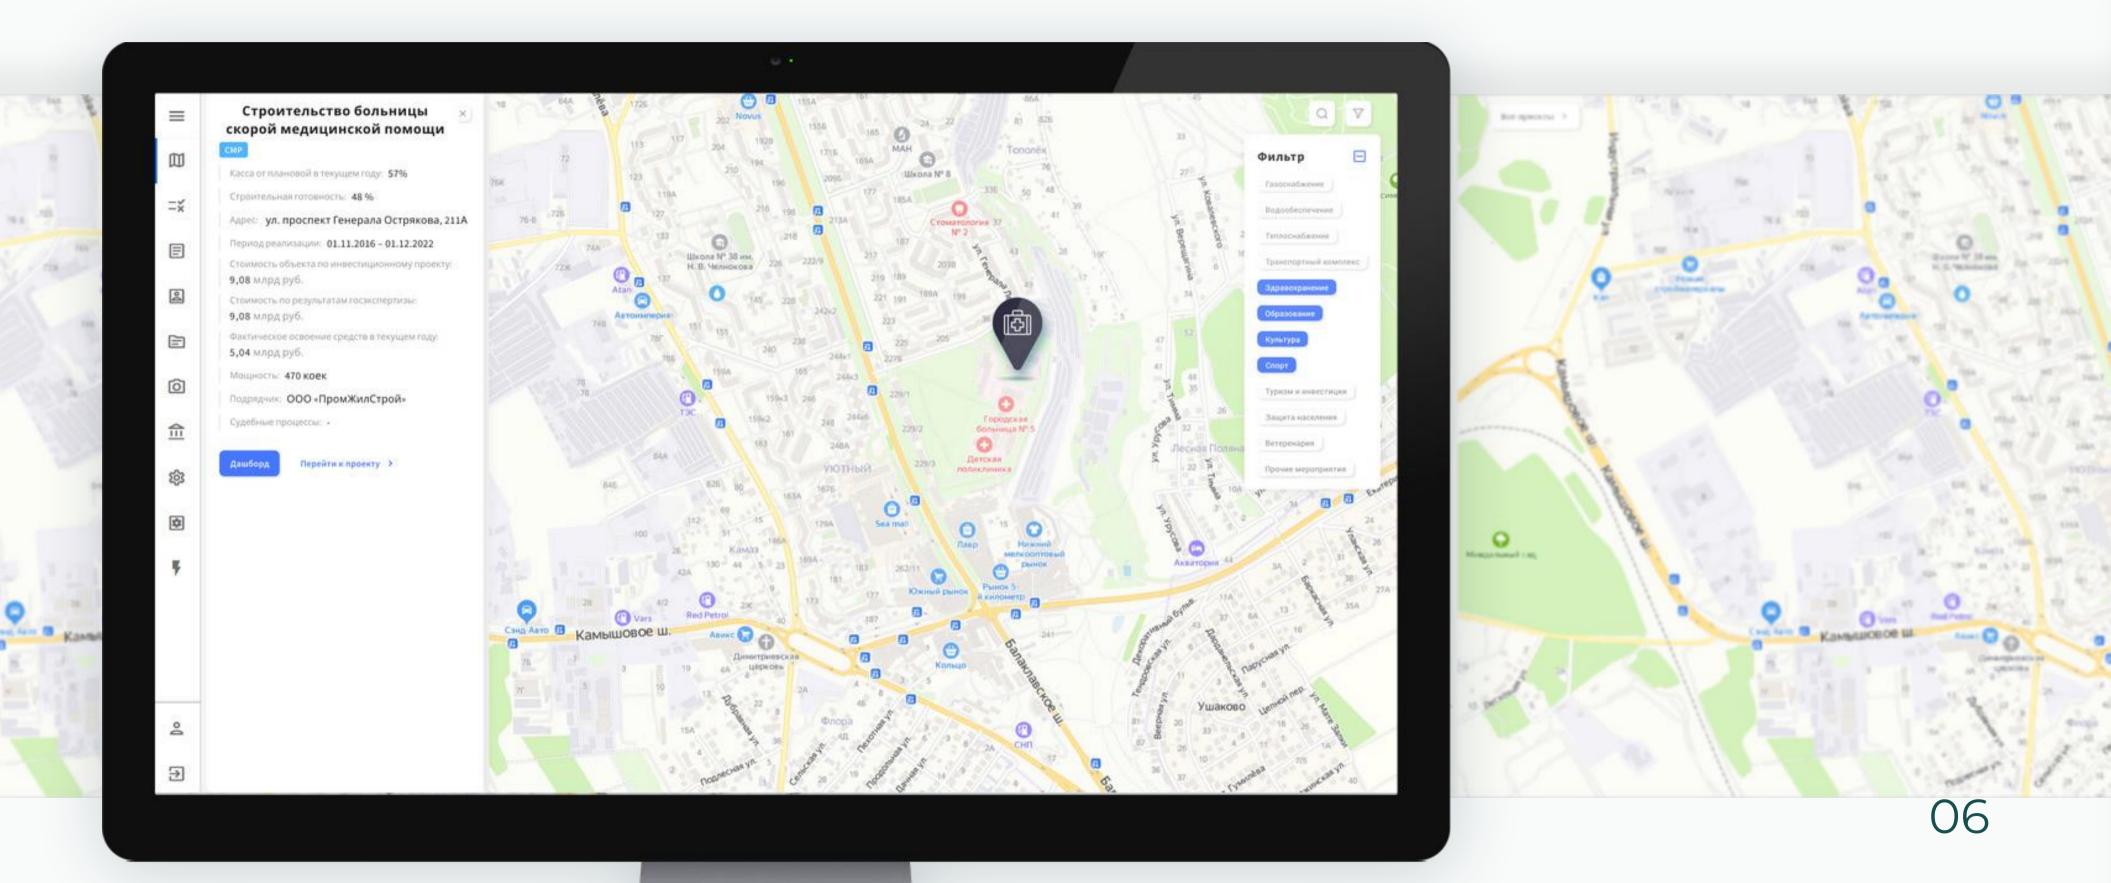




Итоговая проверка (30С)

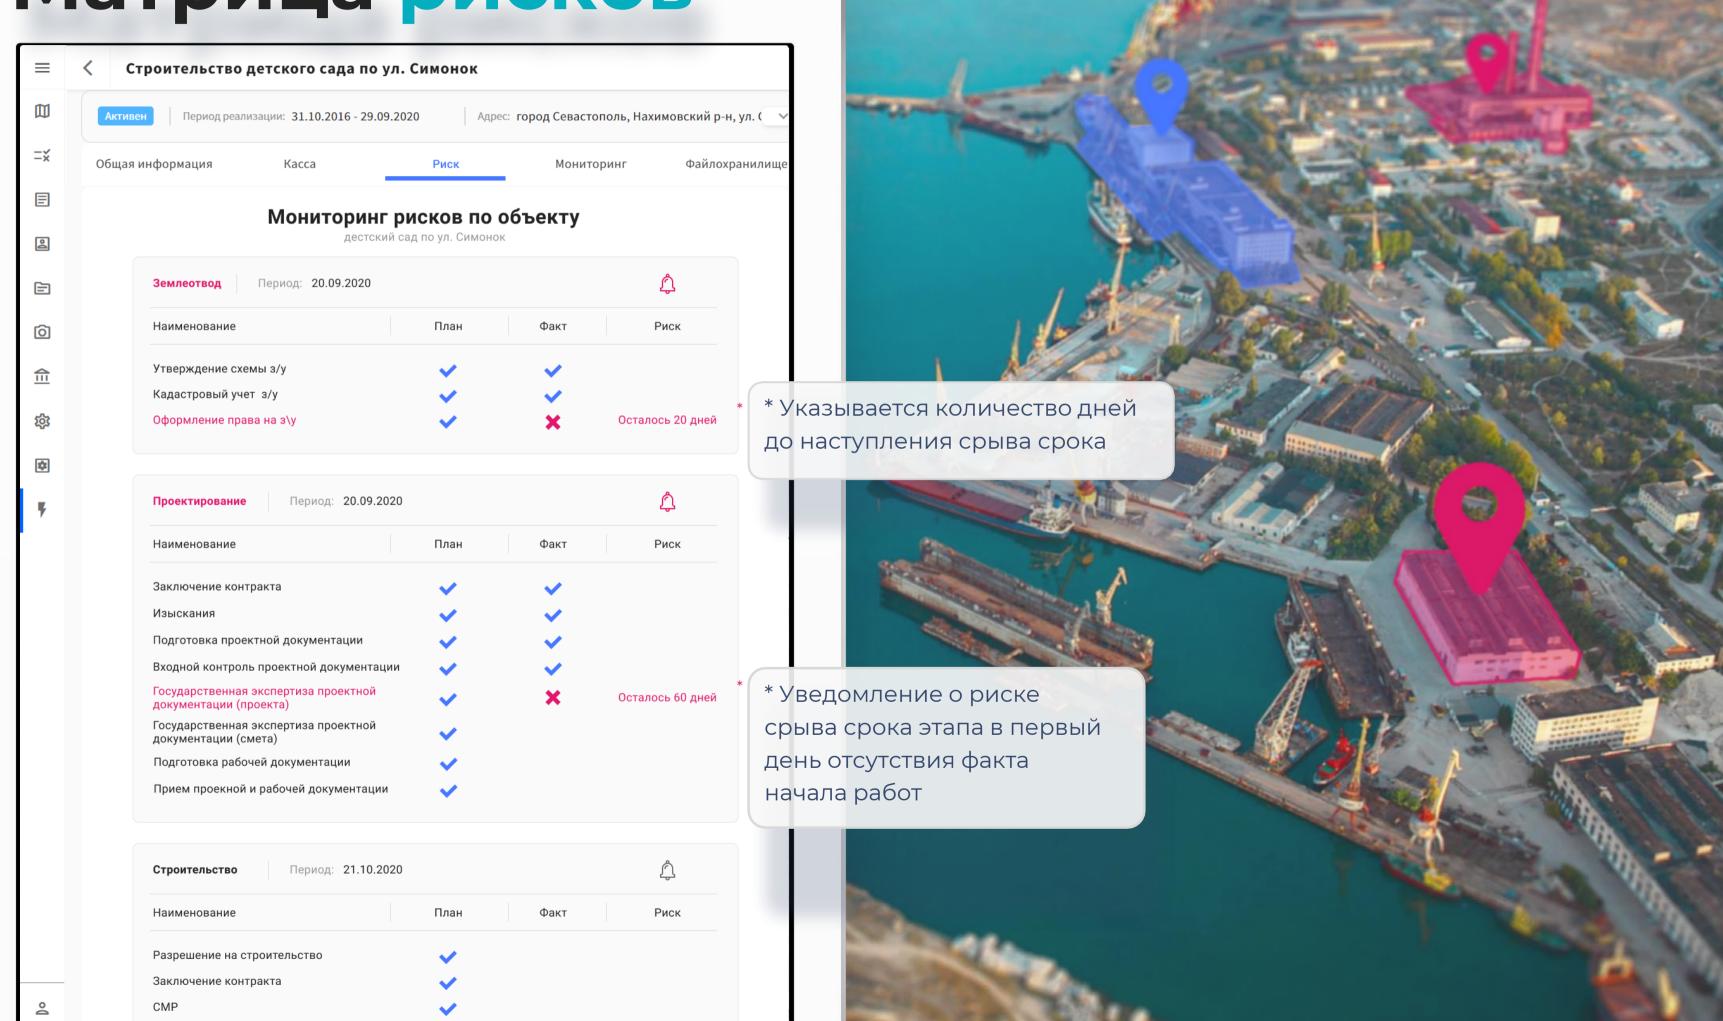

Пользовательский интерфейс

Сводный дашборд


по объектам строительства

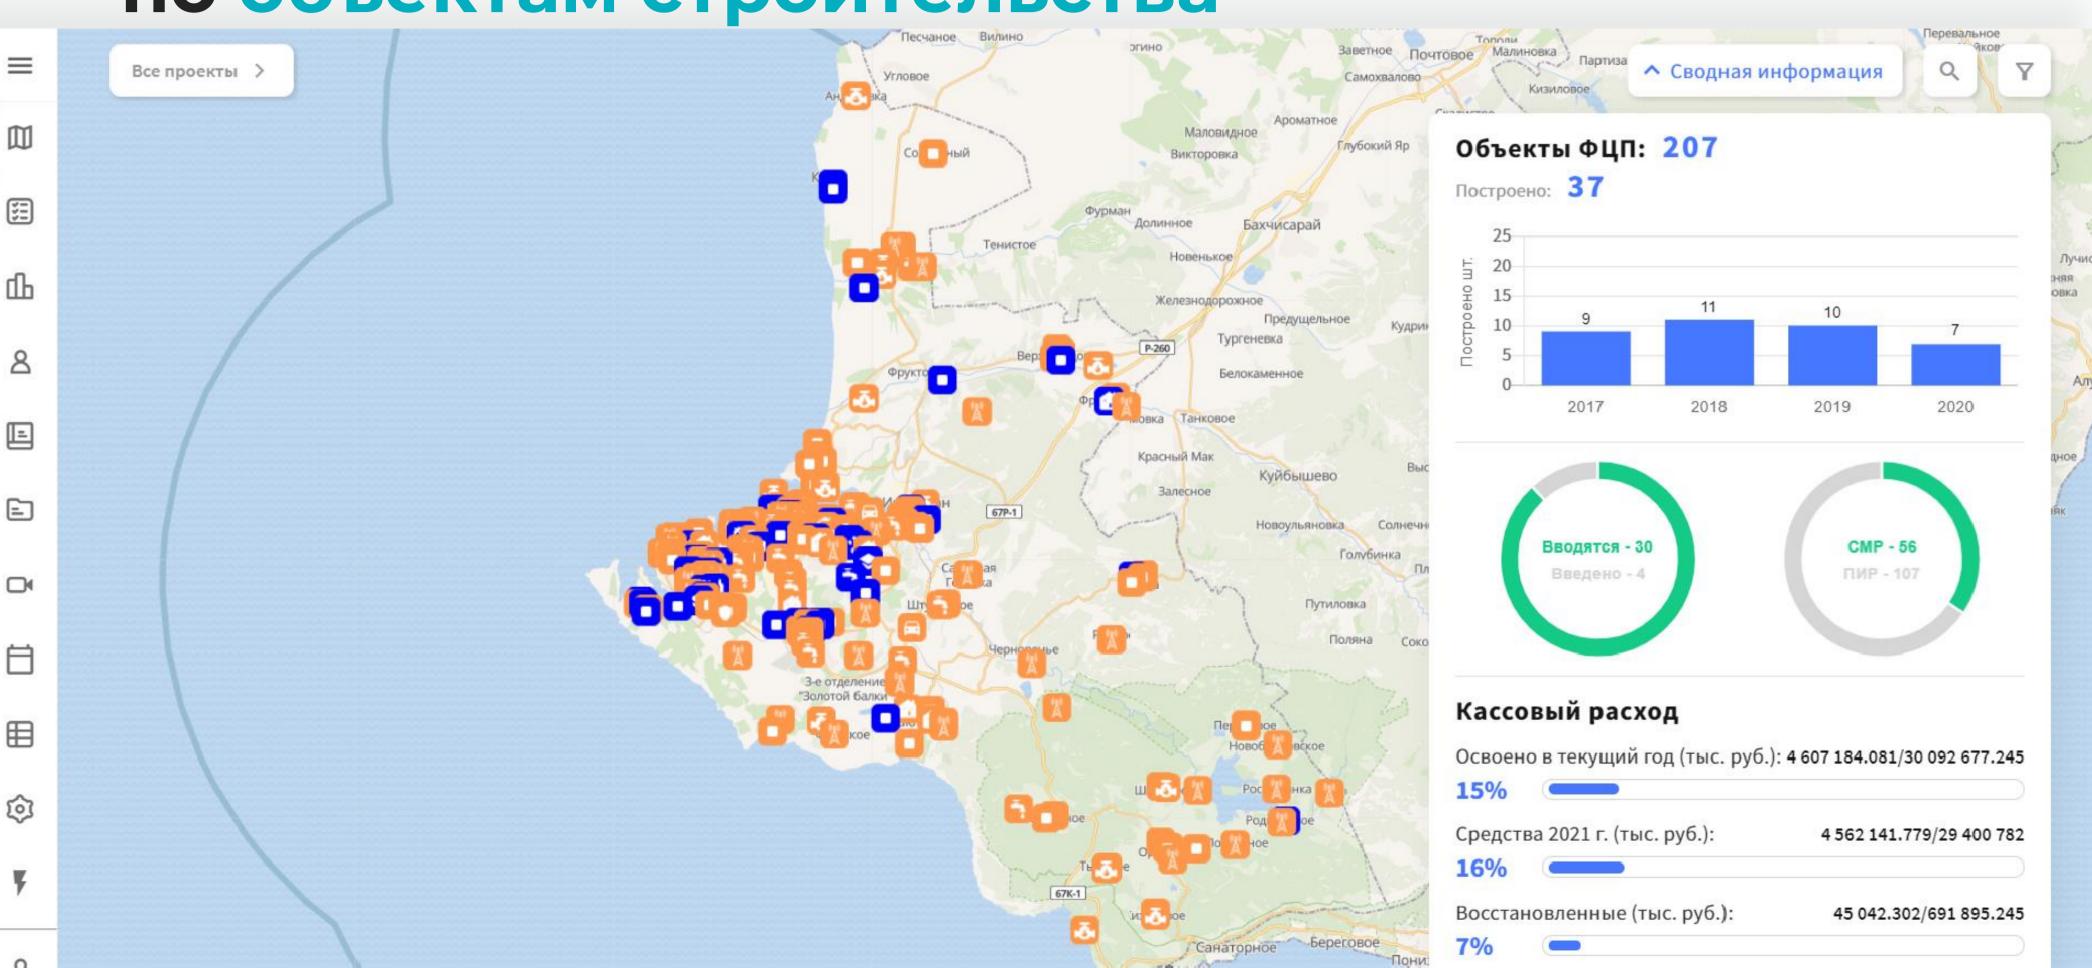


Пользовательский интерфейс

Свод по нацпроектам



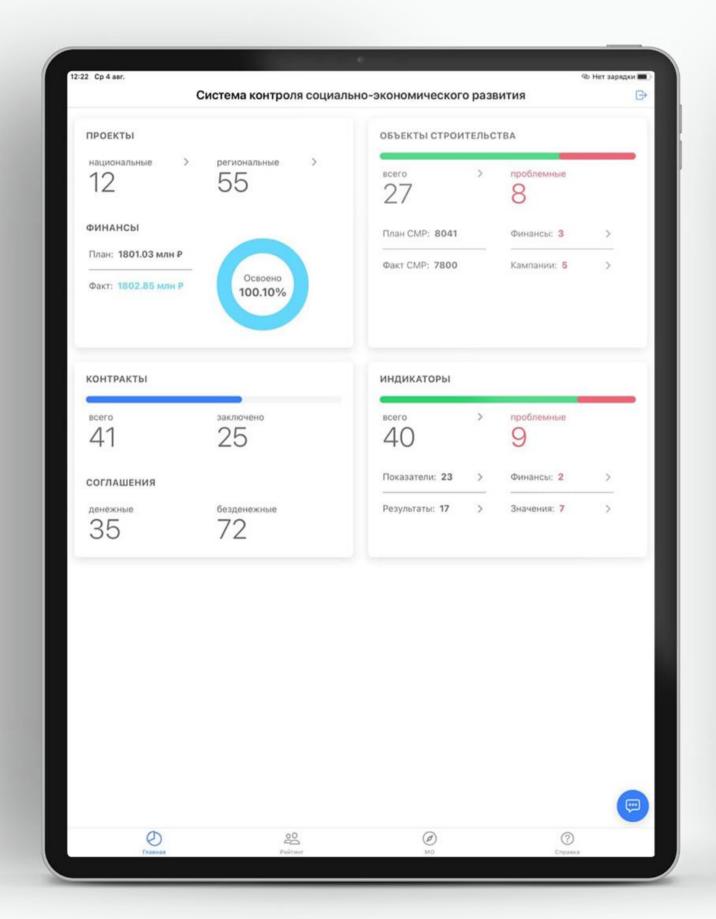

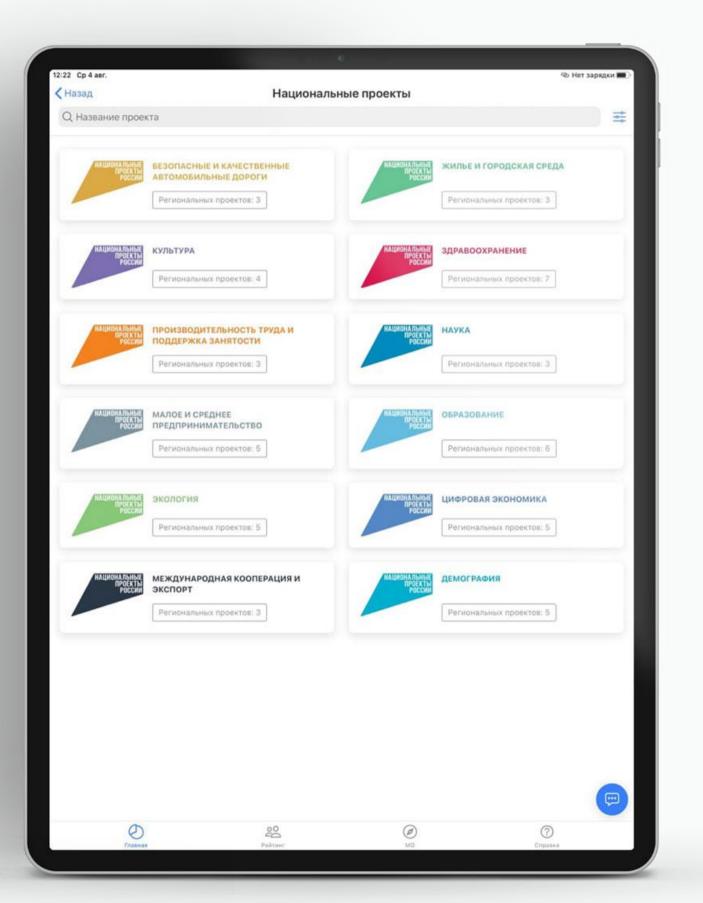





Евгений Крюков

Коммерческий директор

+7 962 834 47 05 ekryukov@at-consulting.ru

Спасибо за внимание!

